

		制定日期	2025/11/30			
		修改日期				
解决方案中心 重点项目支持 流程规范						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆	■产品部、■业务拓展部、■各销售业务部		孙晓天	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/11/30	新建		V1.0	孙晓天
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	销售经理	4
3.2	方案工程师	4
3.3	系统调优工程师	4
3.4	技术产品经理	5
3.5	运营产品经理	5
4	项目界定与分级	5
4.1	重点项目界定标准	5
4.2	重点项目分级	5
5	程序	6
5.1	项目启动阶段	6
5.2	需求对接与分析阶段	6
5.3	方案设计与评审阶段	6
5.4	测试方案制定与执行阶段	6
5.5	项目招投标阶段	7
5.6	项目交付阶段	7
5.7	复盘收尾阶段	7
6	相关文件	7
7	附件与记录	8

1 目的

本文档旨在规范解决方案中心重点项目的支持流程，明确各参与角色的职责边界与协作机制，确保项目支持工作有序、高效推进。通过标准化的流程管理，提升售前方案的专业性、技术评估的准确性、商务可行性分析的全面性，保障重点项目能够精准匹配客户需求，有效控制技术与商务风险，提高项目成功率，最终支撑公司核心业务的稳定拓展与战略目标的实现。

2 范围

本规范适用于解决方案中心承接的各类重点项目的全流程支持工作，涵盖项目售前需求对接、方案设计、技术风险评估、测试方案制定、商务可行性分析及项目交付前的相关支持环节。

重点项目界定标准：符合公司战略发展方向、项目金额达到指定阈值、对公司市场拓展具有重大示范意义或能够带动系列产品销售的项目，具体参见本规范第4条。。

3 职责

3.1 销售经理

作为客户与公司内部的主要对接桥梁，核心负责项目商务层面的沟通与需求传递工作。

具体职责包括：

- 1、主动对接客户商务负责人，明确客户的商务诉求、合作模式、预算范围及项目时间节点要求；
- 2、全程跟进商务谈判进程，及时向公司内部同步谈判进展及客户商务层面的变更信息；
- 3、精准收集客户的项目核心需求、应用场景、现有系统环境等基础信息，确保需求信息完整、准确地传递给方案工程师及其他相关角色；
- 4、协调客户与公司内部的沟通会议，组织需求确认、方案讲解等相关的对接活动；
- 5、负责商务合同条款的初步对接与梳理，配合运营产品经理完成商务可行性评估所需的商务信息收集工作。

3.2 方案工程师

主导售前方案的选型与编写工作，确保方案的可行性、专业性与针对性。

具体职责包括：

- 1、基于销售经理传递的客户需求，深入分析客户应用场景及核心痛点，结合公司现有产品体系及技术能力，进行产品选型与方案架构设计；
- 2、负责撰写售前解决方案文档，内容涵盖方案概述、产品配置、技术实现路径、系统部署方案等核心模块，确保方案内容清晰、逻辑严谨，能够精准匹配客户需求；
- 3、组织方案内部评审会议，收集系统调优工程师、技术产品经理等相关角色的意见，对方案进行优化完善；
- 4、向客户进行方案讲解，解答客户关于方案技术层面的疑问，根据客户反馈进一步调整方案；
- 5、配合销售经理完成方案相关的对接工作，提供方案层面的技术支撑。

3.3 系统调优工程师

聚焦客户测试需求评估与技术风险管控，制定科学合理的测试方案。

具体职责包括：

- 1、对接方案工程师，深入了解客户的测试需求、测试环境要求及性能指标预期；
- 2、结合方案工程师提供的解决方案，评估项目实施过程中可能存在的技术风险（如系统兼容性、性能

瓶颈、数据安全等），提出风险规避建议；

- 3、基于客户测试需求与技术风险评估结果，制定详细的测试方案，明确测试目标、测试范围、测试用例、测试环境配置、测试流程及测试时间节点；
- 4、组织测试方案的实施，协调测试资源，跟踪测试进度，分析测试结果，形成测试报告；
- 5、针对测试过程中发现的问题，协同方案工程师、技术产品经理制定优化方案并推动落实。

3.4 技术产品经理

负责解决项目相关的产品技术问题，保障方案与产品的适配性。

具体职责包括：

- 1、提供公司现有产品的技术参数、功能特性、技术边界等相关信息支持，为方案工程师的产品选型与方案设计提供技术指导；
- 2、针对方案设计过程中涉及的产品技术难题，组织研发团队进行技术攻关，提供可行的技术解决方案；
- 3、参与方案评审与技术风险评估，从产品技术层面提出优化建议，确保方案的技术可行性与产品稳定性；
- 4、必要时，对接客户技术需求，解答客户关于产品技术层面的深度疑问，提供产品技术咨询服务；

3.5 运营产品经理

核心负责评估项目的商务可行性，为项目决策提供商务层面的支撑。

具体职责包括：

- 1、基于销售经理提供的商务信息，结合公司商务政策、成本核算标准，评估项目的商务可行性，包括项目盈利能力、成本控制空间、商务风险等；
- 2、分析项目所在市场的行业趋势、竞争对手情况，为项目商务策略制定提供参考依据；
- 3、参与商务谈判支持，提供商务政策解读、报价策略建议等；
- 4、梳理项目商务流程，配合销售经理完成项目报价、合同审批等相关商务流程的推进；
- 5、评估项目后续的运营成本与收益，为项目长期运营提供决策支持。

4 项目界定与分级

4.1 重点项目界定标准

符合以下任一或多个条件的销售项目，可被界定为“重点项目”：

- **战略价值：**符合公司战略发展方向，对开拓新市场、新行业或巩固核心市场地位具有重大意义。项目主体需采用公司新一代或战略性产品（如 AI 服务器、HG 产品，8501 产品等）。
- **规模与金额大：**常规项目预估服务器采购节点数超过 100 台，或硬件部分金额超过 1000 万人民币。框采项目预估可参与服务器节点数超过 500 台（全年），或硬件部分金额超过 5000 万人民币（全年）。
- **方案复杂度高：**涉及多节点集群（如 HPC、AI 算力集群）、深度性能调优、与特定 ISV、OEM 厂、国产 GPU 厂商联合解决方案认证，或复杂的异构计算整合（如 NV/国产 GPU 算力）。
- **标杆意义重大：**面向互联网巨头、半导体、制造业、金融、AI 算力等核心业务、国家级科研机构等具有行业灯塔效应的客户。
- **客户级别高：**面向集团总部、关键行业头部客户或具有广泛影响力的标杆客户。

4.2 重点项目分级

为合理分配资源，对重点项目进行分级管理：

级别	标准	支持要求
A 级 (特级)	具备全局战略意义,或需顶尖技术攻关的标杆项目。	必须成立专项虚拟团队, 解决方案中心经理牵头, 投入最优资源。
1B 级 (重点)	大型集采项目、关键行业突破项目或面临激烈竞争的项目。	指定资深方案工程师和系统调优工程师作为技术负责人, 跨团队协同支持。
C 级 (一般重点)	具有潜力的中型项目, 需标准化方案和资源协调。	日常接口的方案工程师和系统调优工程师, 按标准流程提供支持。

项目的最终级别建议由销售部门提议, 与解决方案中心共同确认。

5 程序

5.1项目启动阶段

销售经理在获取客户重点项目需求信息后, 邮件发起重点项目支持申请, 内容包括客户基本信息、项目核心需求、项目规模、商务预期、时间节点、竞争情况等关键信息, 必要时会议沟通确认重点项目分级。

随后提交解决方案中心经理审批, 指定方案工程师、系统调优工程师作为核心支持人员, 同时同步技术产品经理、运营产品经理介入项目。

销售经理需及时组织召开项目启动会议, 向各参与角色同步项目基本信息, 明确各角色工作分工与初步时间计划。

5.2需求对接与分析阶段

销售经理牵头组织客户与内部核心支持团队的需求对接会议, 方案工程师配合完成记录会议纪要(技术部分)。

方案工程师负责主导需求分析工作, 针对客户提出的应用场景、功能需求、性能要求等进行深入梳理; 系统调优工程师同步对接客户技术负责人, 补充收集测试相关需求及现有系统环境信息, 为后续技术风险评估做准备。

5.3方案设计 with 评审阶段

方案工程师基于客户需求确认情况, 结合公司产品体系, 开展产品选型与方案设计工作, 编制《项目解决方案》。

方案编制过程中, 需主动征询系统调优工程师关于系统性能、测试适配性的建议, 征询技术产品经理关于产品技术可行性的建议。

《项目解决方案》完成后, 发起组织内部评审会议, 参会人员应包括销售经理、方案工程师、系统调优工程师、技术产品经理、运营产品经理, 视情况邀请解决方案中心经理和其他合作部门人员参与, 重点评审方案的可行性、针对性、技术合理性及商务适配性。

评审通过后, 方案工程师根据评审意见优化方案, 形成最终版《项目解决方案》, 由销售经理提交给客户确认。若客户提出方案修改需求, 重复上述方案优化与评审流程。

5.4测试方案制定与执行阶段

客户完成方案技术确认后, 系统调优工程师基于方案内容及前期收集的测试需求, 编制《项目测试方

案》，明确测试目标、测试范围、测试用例、测试环境配置要求、测试进度计划及风险应对措施。

《项目测试方案》需经方案工程师评审通过，确保测试方案与解决方案匹配、测试覆盖全面。

评审通过后，系统调优工程师协调测试资源，搭建测试环境，组织开展测试工作。

测试过程中，需每日记录测试进度及测试结果，针对发现的问题，及时反馈给方案工程师，必要时同步技术产品经理、销售经理和运营产品经理，协同制定优化方案并完成整改后重新测试。

测试完成后，形成《项目测试报告》，提交给解决方案中心负责人、销售经理及客户，作为项目推进的重要依据。

具体测试支持流程规范，详见 http://ncit.cooacloud.com/shared_docs

【NCIT-文档中心】

- 1、《解决方案中心测试执行规范》
- 2、《解决方案中心测试工作指南》
- 3、《解决方案中心基础性能优化模板》
- 4、《解决方案中心业务性能测试及优化指导》

5.5项目招投标阶段

销售经理牵头组建投标专项小组，成员包括方案工程师、系统调优工程师、技术产品经理、运营产品经理，明确各成员在投标工作中的分工。

方案工程师基于《项目解决方案》及招标文件要求，编制投标文件中的技术方案部分，确保技术响应全面、准确，符合招标参数要求。

系统调优工程师配合提供测试方案、技术风险评估等相关支撑材料。

投标文件编制完成后，技术部分由解决方案中心完成内部评审，必要时采用解决方案中心内部交叉审核、跨部门交叉审核多种形式。

开标后，方案工程师和系统调优工程师做好澄清答疑准备，针对评审专家提出的问题，协同各成员及时提供准确、清晰的答复。

5.6项目交付阶段

若项目中标并完成合同签订，方案工程师和系统调优工程师向交付团队进行技术交底，移交所有技术文档、配置清单、特殊配置说明及客户技术联系人，明确技术注意事项。


5.7复盘收尾阶段

无论中标与否，解决方案中心组织召开项目总结会议，方案工程师汇报工作完成情况，梳理项目推进过程中存在的问题及经验教训，形成《项目复盘报告》。

方案工程师将项目全套资料（需求纪要、方案、选型报告、复盘报告、案例材料等）进行整理，方案中心定期将资料分类入库（方案模板库、案例库、技术选型库、复盘经验库等）；

系统调优工程师将测试全套资料（测试用例、测试数据、优化方案、排障记录等）进行整理，方案中心定期将资料分类入库（基准测试方案、基础测试数据、性能调优手册等）。

6 流程图

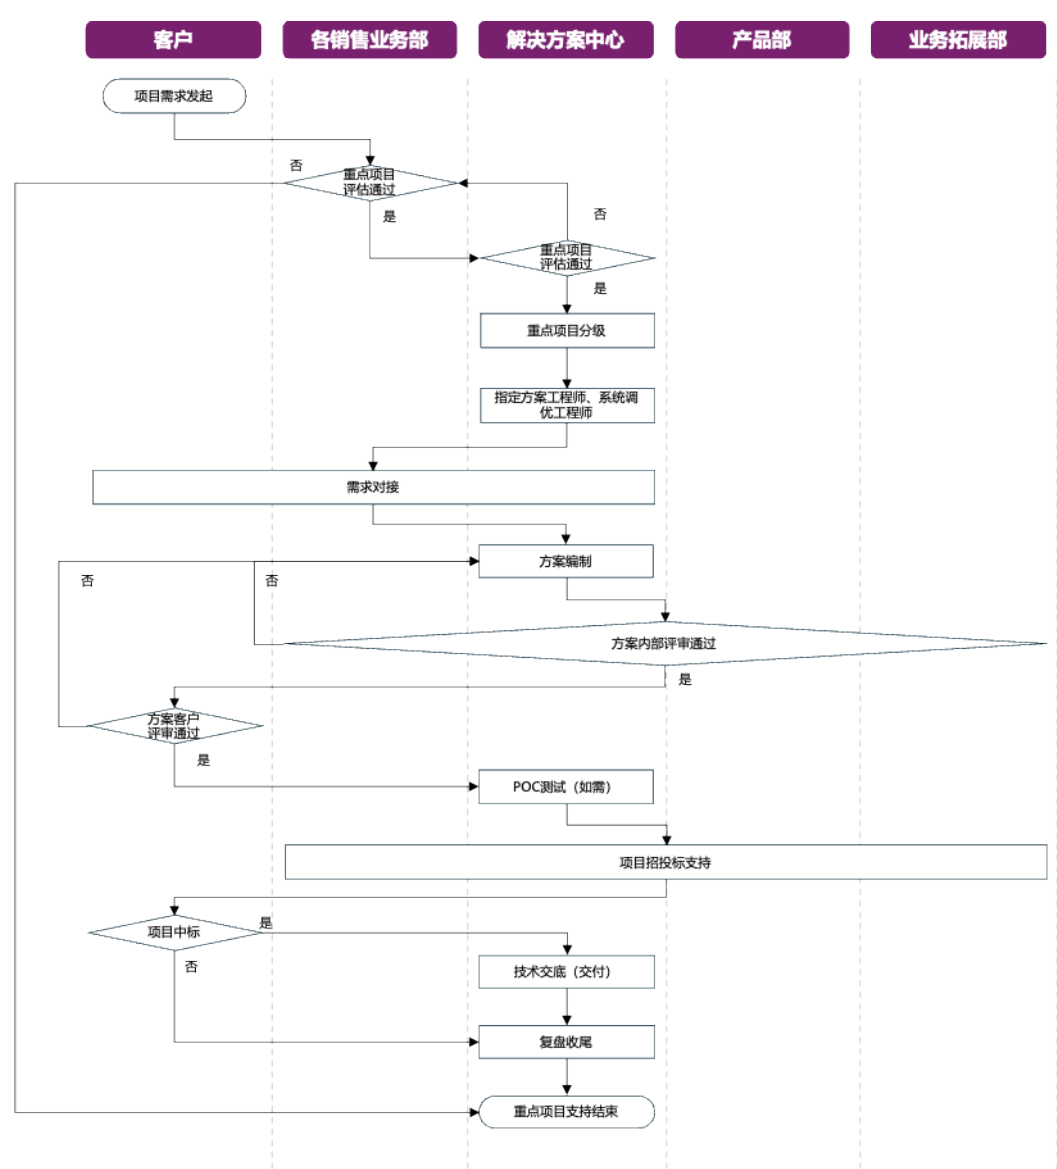

7 相关文件

【NCIT-文档中心】http://ncit.cooacloud.com/shared_docs

- 1、《解决方案中心测试执行规范》
- 2、《解决方案中心测试工作指南》
- 3、《解决方案中心基础性能优化模板》
- 4、《解决方案中心业务性能测试及优化指导》

8 附件与记录

无
