

Nettrix 宁畅	内控等级	■ I 级 □ II 级 □ III 级			
	制定日期	2023.4.20			
	修改日期	/			
三级文件					
文件编号： <u> QI-NC-D-H-039 </u>					
文件名称： <u> 自研板卡 BOM Costdown 管控流程 </u>					
● 文件发行状况 ●			● 文件发行编号 ●		
□ 草稿本 □ 试行本 ■ 发行本			QI-NC-D-H-039		
拟制部门	核 准	审 核	制 定	版 本	总 页 数
产品中心	许飞	□品质管理 □销 售 □制造物流 ■产品中心 □采 购 □综合管理	夏嵩	A/0	共 4 页

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自研板卡 BOM Costdown 管控流程	文件编号：QI-NC-D-H-039
版本：A 版次：0	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2023.4.20	首次制定	/	A/0	夏嵩
2					
3					
4					
5					

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自研板卡 BOM Costdown 管控流程	文件编号：QI-NC-D-H-039
版本：A 版次：0	内控等级：■I 级 □II 级 □III 级

1 目的

本指导的目的是在项目研发过程中，通过流程对板卡的 BOM Costdown 实现管控，提升产品量产的成本竞争力；

2 范围

本文档适用于公司内自研项目中板卡 BOM Costdown 设计的流程管控。

3 职责

系统工程师：根据 PRD，设计满足成本需求的方案，可提供多个可选方案；

硬件工程师：提供关键元器件清单、元器件验证计划，跟进验证结果；

采购工程师：主导对供应商的入围招标和量产招标；

4 主要评审、活动及对应的输入输出物

4.1 系统方案评审：

在项目预研阶段，根据产品端提供的 MRD 和 PRD 文档，对其中的各项需求进行分解，识别出产品成本目标，然后针对目标进行项目方案设计，对于成本影响较大的需求，可以根据具体情况提供多个可选方案，同时也需要采购在此阶段根据部分设计要求推荐供应商，最后通过系统方案评审活动来确定最终方案。在此项活动中，主要的输入输出物和参与人如下：

输入物：①PRD；

输出物：①系统方案；②关键元器件清单；

参与人：①产品经理 A/B；②系统工程师；③采购；④项目组各职能成员；

4.2 供应商选型入围招标：

在系统方案通过评审后，开始进行项目详细设计，根据《关键器件清单》和产品经理提供的典配通用部件覆盖列表以及产品全生命周期预计出货量，采购需要发起入围招标，确认引入哪些供应商的产品进行测试和验证。此项活动中，主要的输入输出物和参与人如下：

输入物：①关键元器件清单；②典配通用部件覆盖列表；③产品全生命周期预计出货量；

输出物：①招标结果—入围供应商列表；

参与人：①产品经理 A/B；②采购；

4.3 元器件/部件验证：

在研发测试阶段，根据系统方案设计以及入围的供应商，确认需要验证物料清单并制定验证计划，在完成验证后根据验证结果输出验证通过物料清单，如出现验证未通过的物料，由采购推荐补充替代的供应商，

宁畅信息 三级文件	
文件标题：自研板卡 BOM Costdown 管控流程	文件编号：QI-NC-D-H-039
版本：A 版次：0	内控等级：■I级 □II级 □III级

并重新安排验证测试工作。此项活动中，主要的输入输出物和参与人如下：

输入物：①元器件/部件验证计划；；

输出物：①验证通过物料清单；

参与人：①项目组研发测试人员；②采购；

4.4 量产招标：


在完成项目内所有验证计划后，采购根据《验证通过物料清单》和预计出货量进行量产招标，根据供应商报价和交期等因素进行综合考量，分配采购比例。此项活动中，主要的输入输出物和参与人如下：

输入物：①验证通过物料清单；；

输出物：①招标结果；

参与人：①产品经理 A；②采购；

5 板卡 BOM Costdown 管控流程

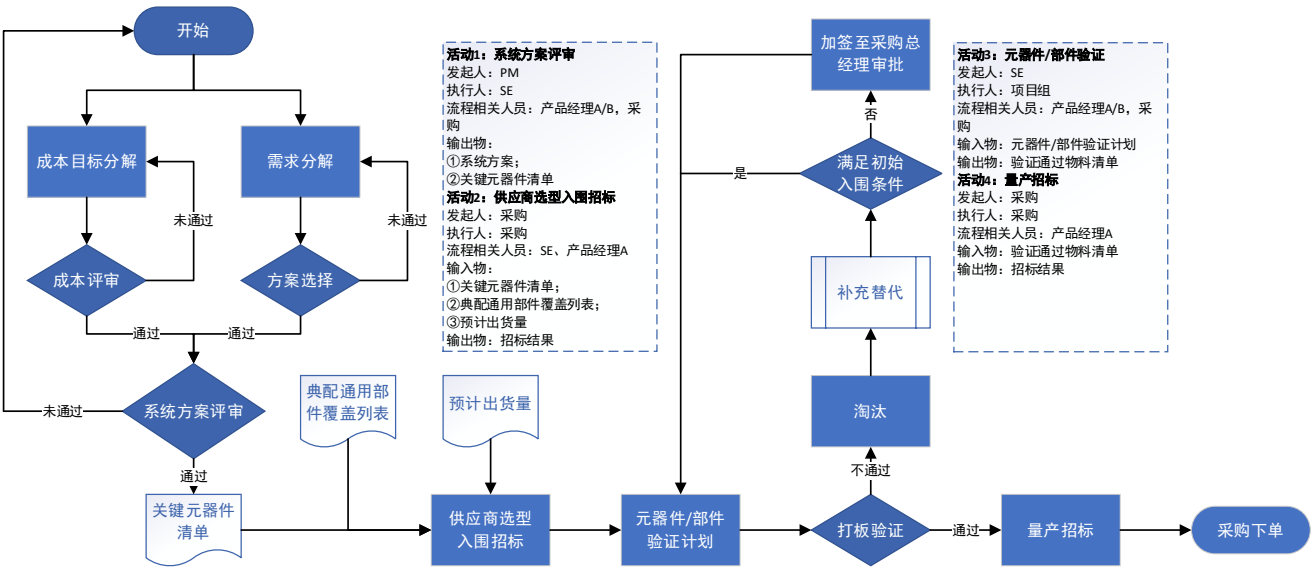

6 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

7 相关文件

无

8 附件与记录
