

	制定日期	2025/12/15
	修改日期	

解决方案中心

算力中心项目需求

调研指南

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
解决方案中心	刘荆	■产品部 ■业务拓展部 ■各销售业务部	叶启业	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/12/15	新建		V1.0	叶启业
2					
3					
4					
5					

目录

1	目的	4
2	范围	4
3	职责	4
3.1	销售经理	4
3.2	方案工程师	4
3.3	技术产品经理	4
3.4	运营产品经理	4
4	程序	5
4.1	调研准备	5
4.1.1	明确调研目标与范围	5
4.1.2	组建调研团队	5
4.1.3	制定调研计划与工具	5
4.2	调研实施	6
4.2.1	项目干系人识别与分类	6
4.2.2	多维度调研执行	6
4.3	需求分析与整理	6
4.3.1	需求数据整理筛选	6
4.3.2	技术可行性与成本分析	7
4.3.3	需求文档编制	7
4.4	需求确认与评审	7
4.4.1	内部评审	7
4.4.2	外部确认	7
4.4.3	需求变更管理	8
4.5	调研成果输出	8
4.5.1	成果交付	8
4.5.2	后续跟进	8
4.6	流程图	9
5	相关文件	9
6	附件	9

1 目的

为面向有算力中心建设需求的客户，通过系统化的需求调研，提升算力资源的精准匹配度，帮助客户有效降低项目风险，提高资源利用效率，推动算力中心从”建得好”向”用得好”转变，特指定本指南。旨在帮助客户厘清真实需求，科学预测未来算力规模，支撑技术选型与架构设计。

2 范围

本指南适用于客户算力中心建设项目初期，面向需求调研所涉及的内容。算力中心项目需求调研，包括调研准备、调研实施、需求分析与整理、需求确认与评审、调研成果输出与后续跟进等环节，本文档进行详细说明。可根据实际情况调整。

3 职责

3.1 销售经理

- 1、建立客户关系，了解客户算力中心建设需求背景。
- 2、评估客户算力中心建设的资金来源，拉通合作伙伴。
- 3、沟通算力中心项目各合作伙伴之间的商务事宜。

3.2 方案工程师

- 1、面向客户方项目负责人、IT 负责人、采购、业务部门代表等人员，进行算力中心需求的调研。
- 2、明确调研对象、时间、方式和预期产出。
- 3、准备调研提纲、业务场景模板、技术术语表等
- 4、输出调研结果，作为客户算力中心项目建设可行性依据。

3.3 技术产品经理

- 1、根据算力中心项目建设的规划，结合产品的主推策略和生命周期，提供产品选型建议。
- 2、调研中提供技术建议，必要时协调后台人员跟进（如 SIT 测试中心部件负责人和产品研发人员）。

3.4 运营产品经理

- 1、协助销售经理评估客户算力中心项目需求，结合上游的供应、成本、产品路线图，提供建议。
- 2、参与算力中心项目需求调研中关于定价策略及市场发布规划。
- 3、跟踪算力中心项目需求涉及的主要部件的市场趋势，收集反馈，参与到需求调研制定的优化方向。

4 程序

4.1 调研准备

4.1.1 明确调研目标与范围

- 1. 核心目标：确定算力中心的服务对象（如政府部门、企业、科研机构、公共服务）、核心应用场景（如 AI 训练、大数据分析、工业仿真）及性能指标需求（如算力规模、存储容量、时延要求）。
- 2. 范围界定：划分调研的业务领域（如普惠算力、智能制造、科学计算/AI for Science、医疗气象）、地理覆盖区域（本地园区、跨区域互联）及时间周期（短期需求中期需求 1-3 年、长期需求 3-5 年）。

4.1.2 组建调研团队

角色	人员配置	核心职责
调研负责人	销售经理	统筹调研计划，协调内外部资源，把控调研进度与质量，审批调研成果
需求分析人	方案工程师、技术产品经理、	1. 识别技术需求，评估技术可行性，设计技术类调研问题 2. 分析用户业务流程，挖掘业务驱动的需求，整理行业需求数据 3. 清洗调研数据，统计问卷结果，转化为算力中心项目建设规划的依据。
项目干系人联络人	销售经理、方案工程师、运营产品经理	对接用户、决策层、监管部门等，安排访谈/勘查，收集反馈意见

4.1.3 制定调研计划与工具

- 1. 计划内容：确定调研时间表（如第 1 周确定对象，第 2-3 周实地访谈）、调研方式（访谈、问卷、现场勘查）及资源预算（人力、差旅、设备）。
- 2. 工具准备：设计调研问卷（含算力需求、预算范围、安全要求等问题）、访谈提纲（针对不同用户群体定制）及现场勘查记录表（记录现有 IT 设施情况）

4.2 调研实施

4.2.1 项目干系人识别与分类

1. 核心项目干系人分析：算力直接使用者（如企业技术部门、科研团队）、决策层（如企业 CEO、政府主管领导）、运维团队（未来负责算力中心运营）。
2. 分类调研策略：对决策层侧重投资回报、政策合规需求；对使用者侧重性能、易用性需求；对运维团队侧重管理效率、故障处理需求。

4.2.2 多维度调研执行

4.2.2.1 面谈调研

1. 一对一深度访谈：针对核心项目干系人，深入了解其业务流程中算力瓶颈（如现有算力是否满足峰值需求）、未来业务扩张计划对算力的增量需求。
2. 追根溯源，将模糊需求转化为量化的需求。
3. “反向验证”需求真实性，结合客户的面谈信息，后续提议现场勘查，通过现有资源使用率现状，分析需求的合理性，避免伪需求。

4.2.2.2 问卷调研

1. 发放范围：覆盖广泛用户群体，包括潜在用户，收集量化数据（如所需算力规模、可接受成本）。
2. 问卷设计技巧：采用封闭式问题（单选、多选）确保数据易统计，搭配少量开放式问题收集创新需求。

4.2.2.3 现场勘查与数据采集

1. 现有设施调研：调研用户现有 IT 机房，了解服务器配置、网络带宽、存储容量，评估算力升级需求。
2. 行业数据收集：分析行业报告（如 IDC、信通院算力需求白皮书），结合区域产业规划，预测未来算力需求增长趋势。

4.3 需求分析与整理

4.3.1 需求数据整理筛选

1. 去除无效数据：剔除问卷中逻辑矛盾、填写不完整的信息，确保数据准确性。
2. 优先级排序：将需求分为“必需需求”、“应需需求”、“可选需求”。
3. “书面确认” 每一步，需求调研后 24 小时内，将《交流纪要》（含需求点、量化指标）发给用

户签字；现场勘查后，让用户在《勘查记录表》上标注“情况属实”，避免后期用户对需求调研的内容真实性存疑或提出异议。

4. 交叉验证核心需求，对关键需求找 2-3 个典型用户做“模拟测试”，用现有算力资源模拟，让用户确认对应算力“是否满足业务需求”，避免需求估算偏差。

4.3.2 技术可行性与成本分析

1. 技术匹配度：评估需求与现有技术的兼容性，如用户所需的 GPU 算力是否可通过主流服务器实现，网络时延要求是否符合现有网络架构。
2. 结合行业趋势定扩容预留，参考行业增速：如 AI 行业算力需求每 6 个月翻倍，调研时需预留“3 年内扩容 2 倍”的空间（如机房预留额外机柜位置、电路按 2 倍算力设计）。
3. 向用户确认未启动的业务：“未来 1-2 年是否有新业务（如 AI 质检、数字孪生）？需要多少额外算力？”避免忽略潜在需求（如某制造企业调研时未提数字孪生，建成后 6 个月就需要，只能额外投入改造）。
4. 成本估算：根据需求规模，估算硬件采购（服务器、存储设备等）、软件授权（操作系统、平台软件等）、运维管理（人力、能耗）的成本，判断需求的经济可行性。
5. “成本预警”前置：若用户需求远超预算，需要通过引导用户接受分期建设的规划，并确认建设优先级。

4.3.3 需求文档编制

1. 核心文档：撰写《算力中心项目需求规格说明书》，明确需求描述、验收标准、约束条件。
2. 辅助文档：整理《用户需求调研纪要》《问卷调研统计报告》，作为需求说明书的支撑材料。

4.4 需求确认与评审

4.4.1 内部评审

团队内部评审：组织调研团队、技术团队、项目管理团队召开评审会，检查需求文档的完整性、逻辑性，确保无遗漏或矛盾需求。

4.4.2 外部确认

1. 用户确认：向各项目干系人/部门，展示需求文档，通过会议讲解、邮件反馈等方式，获取用户对需求的确认意见，解决需求理解偏差。
2. 专家评审：通过客户邀请行业技术专家、第三方咨询机构，对需求的合理性、前瞻性进行评审，提

出优化建议（如调整算力扩容方案以适应未来 3 年需求）。

4.4.3 需求变更管理

变更流程：若用户提出需求变更，需填写《需求变更申请表》，说明变更原因、影响范围（如成本增加、周期延长），经评审通过后方可更新需求文档。

4.5 调研成果输出

4.5.1 成果交付

最终形成《算力中心需求调研报告》，核心章节包括：


1. 用户需求规格说明书
2. 算力需求测算模型与结果
3. 技术架构建议（硬件选型、网络拓扑、软件栈）
4. 服务与商业模式设计
5. 风险与应对策略（如需求波动、技术迭代）
6. 附录：原始数据、问卷、访谈记录（脱敏）

报告应用价值：作为后续可行性研究、初步设计、招标文件的核心输入，指导算力中心精准匹配用户需求。

4.5.2 后续跟进

成果汇报：向决策层进行调研成果汇报，重点说明需求核心要点、可行性分析结论及下一步工作建议。

4.6 流程图

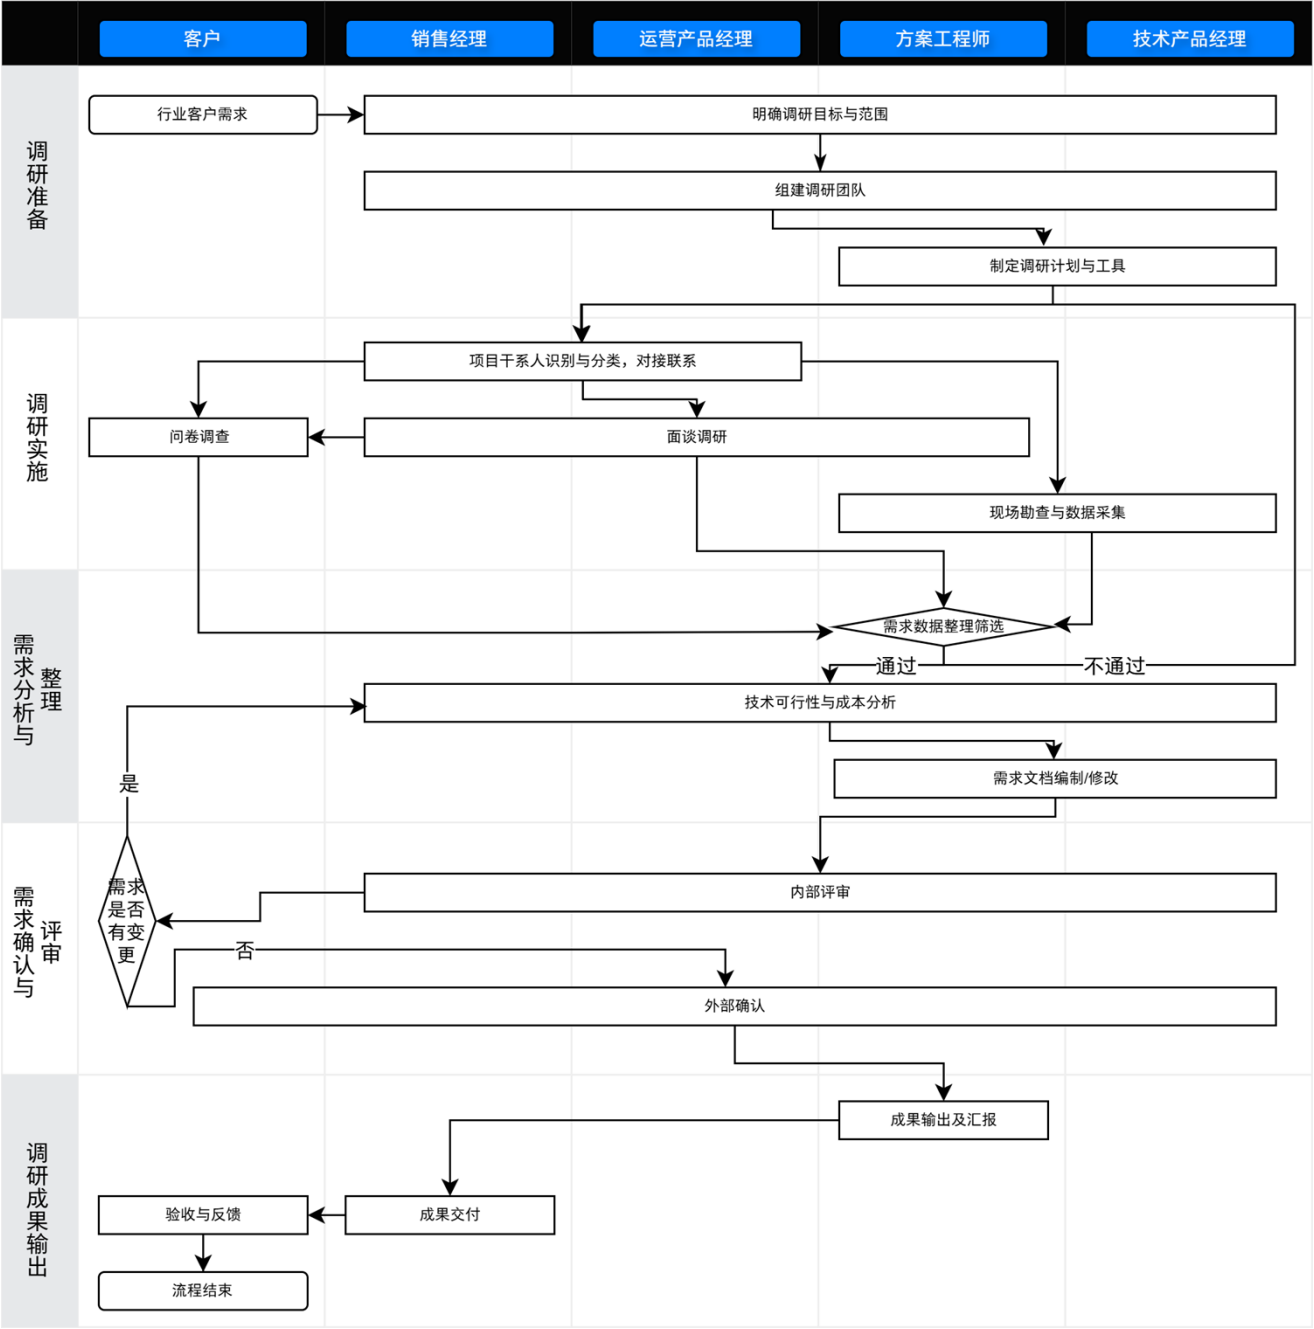

5 相关文件

无

6 附件

无
