

投标项目管控工作指导

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
业务拓展部	陈勇、魏冰清、 赵雷	☐品管 ☒产品 ☒销售 ☐采购 ☐制造 ☐综管	朱炯	V1.0	共 11 页

变更记录

No	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2024/11/13	首次撰写		V1.0	朱炯

目录

1.	投标项目管理的目的	4
1.1.	提高中标概率	4
1.2.	确保项目盈利	4
1.3.	维护公司形象	4
1.4.	优化资源配置	4
2.	投标项目管理中的各角色职责	5
3.	项目管控流程——泳道图.....	6
4.	投标项目的阶段管理方式及说明	7
4.1	LA 销售线索	7
4.2	L1 立项	7
4.3	L2 确认方案	8
4.4	L3 招投标	9
4.5	L4 中标	10
4.6	L5 实施完毕	10
4.7	L6 放弃	10
4.8	L7 停止	10
4.9	L8 落标	11
4.10	L9 暂停	11

1. 投标项目管理的目的

1.1. 提高中标概率

- 精准响应招标文件
 - 仔细研究招标文件的要求，包括技术规格、商务条款、交付期限等，确保投标文件能够准确、全面地响应这些要求。通过精心准备投标文件，展示公司的实力和优势，增加评委对投标方案的认可度。
 - 例如，在项目投标中，对招标文件中规定的软硬件技术参数、质量标准等进行详细分析，制定针对性的解决方案，以提高中标可能性。
- 突出竞争优势
 - 分析竞争对手的情况，找出自身的独特优势和差异化竞争点。在投标文件中重点突出这些优势，如先进的技术、丰富的经验、良好的口碑等，使公司在众多投标者中脱颖而出。
 - 比如，在同类型项目投标中，强调公司拥有完整的可切和客户实际需求的方案、高效的项目管理团队以及成功的类似项目案例。

1.2. 确保项目盈利

- 合理估算成本
 - 对投标项目进行详细的成本估算，包括产品资源投入成本、材料成本、制造成本、汇率换算、部件趋势等。通过准确的成本估算，制定合理的投标价格，确保在中标后项目能够实现盈利。
 - 例如，在框架类项目投标中，对物料采购、部件趋势、汇率趋势、L6 成本 Costdown 等各种环节的成本进行精确计算，避免因成本估算错误导致项目亏损。
- 控制风险成本
 - 识别投标项目可能面临的风险，如技术风险、市场风险、合同风险、合规风险等，并对这些风险进行评估和量化。在投标价格中考虑风险成本，确保在项目实施过程中能够有效应对各种风险，保证项目的顺利进行和盈利目标的实现。
 - 比如，在 C 类名单客户项目投标中，考虑合规等风险因素，在无法确认风险时引入法务部门介入给予专业的指导建议，规避公司合规以及法务风险

1.3. 维护企业形象

- 提供优质服务
 - 通过高质量的投标文件和专业的投标团队，向客户展示企业的专业素养和服务水平。如果中标，在项目实施过程中严格按照合同要求履行义务，提供优质的产品和服务，树立良好的企业形象。
 - 例如，避免中标项目上架过程中把客户机房已有运行业务的设备强行下线，造成客户业务损失，交付设备性能不如客户预期时及时排查原因，设备出现状况（失火烧毁）及时推动前端安抚客户情绪，拉通后台产品资源进行故障排查分析


1.4. 优化资源配置

- 合理判断资源投入必要性
 - 根据投标项目的需求，合理协调产品内部的人力、物力资源。确保在投标阶段能够投入足够的资源进行项目分析、方案制定和投标文件编制，提高投标效率和质量。
 - 例如，在大型项目投标中，组建由产品、销售、BD、解决方案等组成的投标团队，判断是否需要投入资源，以及合理制定应标方案，提高团队协作效率。

2. 投标项目管理中的各角色职责

项目角色	相关职能
销售经理	客户关系的拓展者和维护者，负责了解客户需求、建立并巩固客户关系，准确把握客户的痛点和关键需求点
方案工程师	具备深厚的技术和产品知识，能够根据客户需求，定制化地设计出最适合客户的解决方案，包括产品组合、技术架构、服务支持等方面
运营产品经理	深入了解客户需求, 把握客户及行业中长期发展趋势，对内促进内部协同、打破传统部门壁垒，对外强化市场竞争力、快速响应市场变化以及客户需求
技术产品经理	负责确保解决方案的技术可行性，保证项目按时、按质、按量完成，同时对交付过程中的风险进行有效管控，协调内部资源以满足客户的交付要求

3. 项目管控流程——泳道图

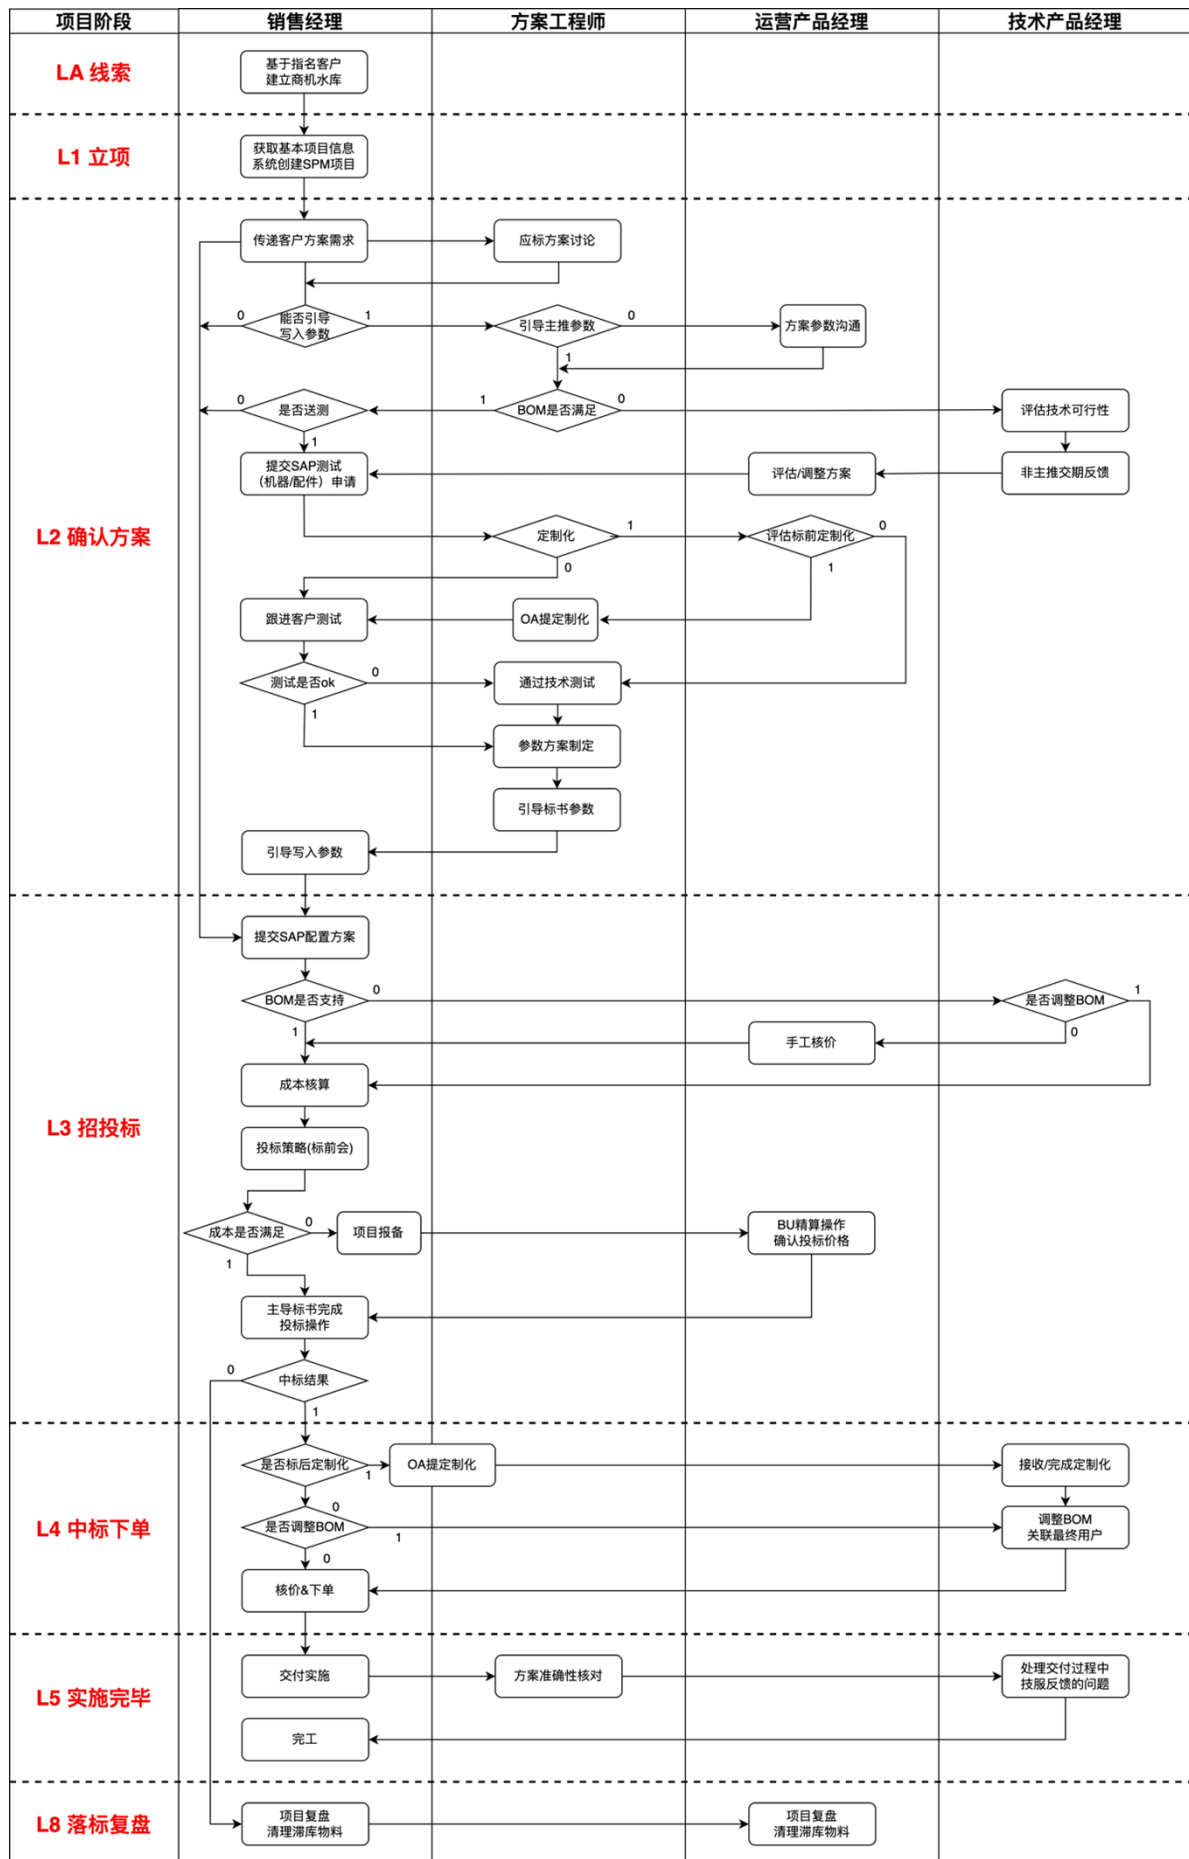

4. 投标项目的阶段管理方式及说明

4.1 LA 销售线索

LA	项目角色	相关职能
	销售经理	针对所有指名客户定期 SPM 建立项目
	方案工程师	客户端需求的前期支持，初步方案撰写
	运营产品经理	现有方案无法支撑时，判断市场进入机会，初步评估进入可行性
	技术产品经理	判断技术可行性

4.2 L1 立项

阶段说明：客户内部完成项目立项

L1	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 建立客户关系，确认决策链，建立商务关系 B. 明确客户预算以及我方参与的金额规模 C. 准备产品送测，解决测试（入围）商务问题 D. 核价，并做核价检查，确保核价配置准确性
	方案工程师	A. 依据客户需求，撰写技术方案 B. 识别非主推物料清单，给 BD 预警 C. 识别需求涉及未量产机型，或者现有 BOM 是否能支持 D. 配合销售检查 SPM 系统核价出的配置及物料等信息，针对有疑问的地方进行标注
	运营产品经理	A. 依据客户需求，预订制定方案（支持售前工作） B. 传递非主推物料清单给产品
	技术产品经理	A. 未量产机型或者现有 BOM 无法支持的情况下，判断技术可行性 B. 所有的方案中如涉及非主推物料，针对非主推物料给出可交付的交期反馈

4.3 L2 确认方案

阶段说明 :技术交流, 促使客户认可我方产品技术方案; 商务运作, 引导客户认可我方商务参数; 售前技术交流: 方可推进到 L2 阶段; 售前确认产品方案 QT ; 进入到 L2 阶段后, 售前方可出集成类方案;

L2	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 获取项目信息, 确认实际需求 (90 单) B. 建立客户关系, 确认决策链, 建立商务关系 C. 引导写入我司优势技术、商务参数 (后续标书体现) D. 项目信息同步会或邮件方式同步招标信息 E. SPM 系统内填报该预测 F. 精算报备 (系统) G. 销售在 OA 提交定制化申请
	方案工程师	A. 依据客户需求, 制定方案编写 (90 单) B. 提供我司优势技术参数供销售引导 (标准模板输入工具) C. 大项目特价申请材料 (技术部分, 标准模板输入工具) D. 协助解决测试技术问题 E. 识别非主推物料清单, 给 BD 预警
	运营产品经理	A. 针对 OA 主推资料, 无法覆盖客户需求 B. 输出明确参数意见" C. 客户传递标前定制化需求 D. 明确资源投入节奏" E. SPM 系统 BD 共识 F. 输出竞争分析
	技术产品经理	A. 基于销售提交的 OA 定制化申请, 为满足当前不满足的技术特性及支持范围所需要支持的新特性或新部件所需投入的技术可行性评估及计划交期反馈 B. 针对千万级项目方案成本预优化 C. 标前定制化项目分析, 反馈定制化周期 D. 评估接单能力

4.4 L3 招投标

正式发标：

公开招标：提供《招标文件》；

其他招标方式（邀请招标/竞价谈判/询价/单一来源采购/直接采购/协议采购等）：招标文件的等价物，如：客户官方邮箱的署名邮件等；

补充：特殊情况：须提供一级总和营销部门总经理的备书邮件；

满足以上条件时，可推进至 L3 阶段；

发布《招标文件》后直接推 L3 阶段

项目需在 L2 阶段进行精算，

除稀缺物料外，≥1000 万的项目必须进行大项目标前会

<1000 万的项目 BD 直接支持投标策略，不需要向上汇报

L3	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 拉通 营销、售前、产品、销售进行标前会 ≥1000 万 项目标前会核心元素包含如下（参考：标前会模板） a) 决策链条梳理 b) 评分模拟（含 技术、商务、主观 或其他）--销售打分输出（依据招标文件） c) 投标价格模拟（含友商模拟） d) 历史项目复盘（如有历史参与）--可选” B. 输出标前会会议纪要 C. 主导完成应标标书 D. 确认最终投标策略 E. 投标后运作（包括但不限于，二次报价、强制流标等） F. 完成除了技术部分以外的投标文件
	方案工程师	A. 拉通前（销售）后（产品）端解决测试问题” B. 确认方案可行（新导入测试、定制化） C. 协助销售，主笔完成应标文件（技术部分） D. 准备述标资料，完成项目述标（如有此环节） E. 识别非主推物料清单，给 BD 预警
	运营产品经理	A. 依据项目状况进行精算-千万级以上项目仅支持 L3 阶段精算，给出投标价建议 B. 在对应月份的系统中针对之前已提报的共识预测进行调整
	技术产品经理	A. 拉通后端资源，确保技术问题解决；如确有困难解决不了需及时反馈

4.5 L4 中标

完成投标并收到《中标通知书》、或已与客户或中标集成商等签订采购协议/采购合同、或客户/伙伴明确身份署名的“需求邮件”截图，及其他有效凭据，由销售人员提交资料并由营销 Review 人员核验后推送 L4 阶段；原则上满足以上条件，具体可参见文章第三章《推送中标管理》，可推进至 L4 阶段；

L4	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 标后定制化项目：完成下单并提交定制化、特申等
	方案工程师	A. 输出定制化需求和特申需求
	运营产品经理	A. 确保下单价格与投标价格一致 B. 精算和价审
	技术产品经理	A. 确认定制化与特申需求的有效性和正确性 B. 交付保障计划与反馈

4.6 L5 实施完毕

销售完成下单，且后续不再追加时，可推进至 L5 阶段；

L5	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 确保交付实施完成 B. 推动技服（售中）完成现场实施工作，并主导组织协调现场实施过程中的各类跨部门问题
	方案工程师	A. 交付实施过程中产生问题时售前方案准确性核对
	运营产品经理	A. 控制整体交付成本
	技术产品经理	A. 处理技服反馈至产品 BU 技服接口且技服接口无法处理的现场实施技术问题

4.7 L6 放弃

由于我司原因（如无对应产品，没有获得邀请等），销售员决定放弃继续参与项目

L6	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	方案工程师	A. 项目复盘 B. 指定复盘有代表性项目
	运营产品经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	技术产品经理	A. 已备货物料的处理

4.8 L7 停止

由于客户原因造成项目取消、或其他客观原因（如重复立项、错误立项等）导致项目无法继续；

L7	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	运营产品经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	技术产品经理	A. 已备货物料的处理

4.9 L8 落标

完成投标并已确定丢标的项目

L8	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	运营产品经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	技术产品经理	A. 已备货物料的处理

4.10 L9 暂停

项目暂停：如果连续一个月以上无任何销售动作或项目进展，暂停项目

L9	项目角色	相关职能
	销售经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	运营产品经理	A. 项目复盘 B. 已备货物料的处理
	技术产品经理	A. 已备货物料的处理
